

Nyhedsbrev 2 – Område 1 i Slagelse Vest

Den 03-05-2024
Kontaktperson: Hans Post
T: 58 36 25 00
E: fjvslagelsevest@envafors.dk

Udbygning af fjernvarmenettet i Slagelse Vest

Det går rigtig godt med fjernvarmearbejdet, og vi arbejder i øjeblikket bl.a. med at få retableret renderne for de nye fjernvarmeledninger langs stien mod vandtårnet og på Verdisvej. På Wagnersvej, Schubertsvej samt langs stien efter vandtårnet ned mod Mozartsvej er vi godt i gang med at få gravet renderne og lagt de nye ledninger. Sideløbende hermed pågår udførelsen af stikledninger til beboer/ejendomme, som har tilmeldt sig fjernvarmen, og man vil blive kontaktet af entreprenøren for gennemgang af det aftalte stiktrace mv. inden arbejdet igangsættes. Fjernvarmearbejdet på Valbygårdsvej er desværre blevet udskudt med nogle uger, da den nye fjernvarmeledning på Holmstrupvej skal være etableret helt frem til Marievangsvej, før fjernvarmearbejdet må igangsættes.

På strækninger, hvor der arbejdes med fjernvarmen, vil kørebaner være indsnævret, og vi håber på jeres forståelse herfor 😊.

LK Group er næsten færdig med at kontakte beboere af ejendomme, som har tilmeldt sig fjernvarmen, for besøg i forbindelse med fastlæggelse af stiktrace mv.

Når entreprenøren er færdig med udførelsen af jeres fjernvarmestik, vil der blive udleveret en tilfredshedserklæring fra entreprenøren, hvor I kan komme med ris eller ros i forbindelse med fjernvarmearbejdet. Det er også på tilfredshedserklæringen, I bedes oplyse evt. skader og mangler, så disse kan blive udbedret af entreprenøren. Tilfredshedserklæringen vil enten blive udleveret af entreprenøren selv eller den vil blive lagt i jeres postkasse.

Vejledende tidsplan for område 1:

Sti/græsareal mod vandtårnet: Udførelse af hovedledninger pågår og vil være færdig i uge 19.

Sti/græsareal efter vandtårnet mod Schubertsvej: Udførelse af hovedledninger er i gang og forventes færdig i uge 19.

Sti/græsareal fra vandtårnet mod Valbygårdsvej: Udførelse af hovedledninger forventes udført i uge 20 til og med uge 22.

Byvej: Udførelse af hovedledninger opstartes i uge 19 og forventes færdig i uge 21. Udførelse af stik er færdig.

Verdisvej: Udførelse af hovedledninger pågår og vil være færdig i uge 19. Udførelse af stik er færdig.

Wagnersvej: Udførelse af hovedledninger pågår og forventes færdigt i uge 19. Udførelse af stik pågår og forventes færdig i uge 19.

Kuhlausvej: Udførelse af hovedledninger pågår og forventes færdig i uge 20. Udførelse af stik pågår og forventes færdig i uge 20.

Holmstrupvej: Hovedledninger forventes udført i uge 21 til og med uge 23. Stik forventes udført i uge 19/20 til og med uge 22.

Valbygårdsvej: Tidspunkt for opstart af hovedledninger kommer med næste nyhedsbrev.

Schubertsvej: Udførelse af hovedledninger pågår og forventes færdig i uge 19. Stik forventes udført i uge 22 til og med uge 24.

Mozartsvej: Udførelse af hovedledninger pågår og forventes færdig i uge 19. Udførelse af stik pågår og forventes færdig i uge 21.

Haydnsvej: Hovedledninger forventes udført i uge 23 til og med uge 25. Stik forventes udført i uge 22 til og med uge 24.

Bachsvej: Hovedledninger forventes udført i uge 20 til og med uge 22. Stik forventes udført i uge 22 til og med uge 24.

Weysesvej: Hovedledninger opstartes i uge 18 til og med uge 21.

Lumbyesvej: Hovedledninger forventes udført i uge 24 til og med uge 25.

Hartmannsvej: Hovedledninger forventes udført i uge 21 til og med uge 23.

Enghavevej og Griegsvej: Hovedledninger forventes udført i uge 22 til og med uge 24.


Vejledende udførelstider for stikledninger vil blive tilføjet tidsplanen i nyhedsbrevene løbende for vejene i jeres område.

Med venlig hilsen
Hans Post

Nyttige mail-adresser

Envafors:	E-mail
Hans Post – Projektleder og tilsyn	fjvslagelsevest@envafors.dk
Hovedentreprenør MSE A/S:	
Brian Pyndt – Formand	bp@mse-as.dk
Kaj Hansen – Formand f. stik	kfh@mse-as.dk
Louise Jørgensen – Projektassistent v. spørgsmål til før-fotoregistrering mv.	lkj@mse-as.dk

Oversigtstegning med etapeinddeling for område 1:

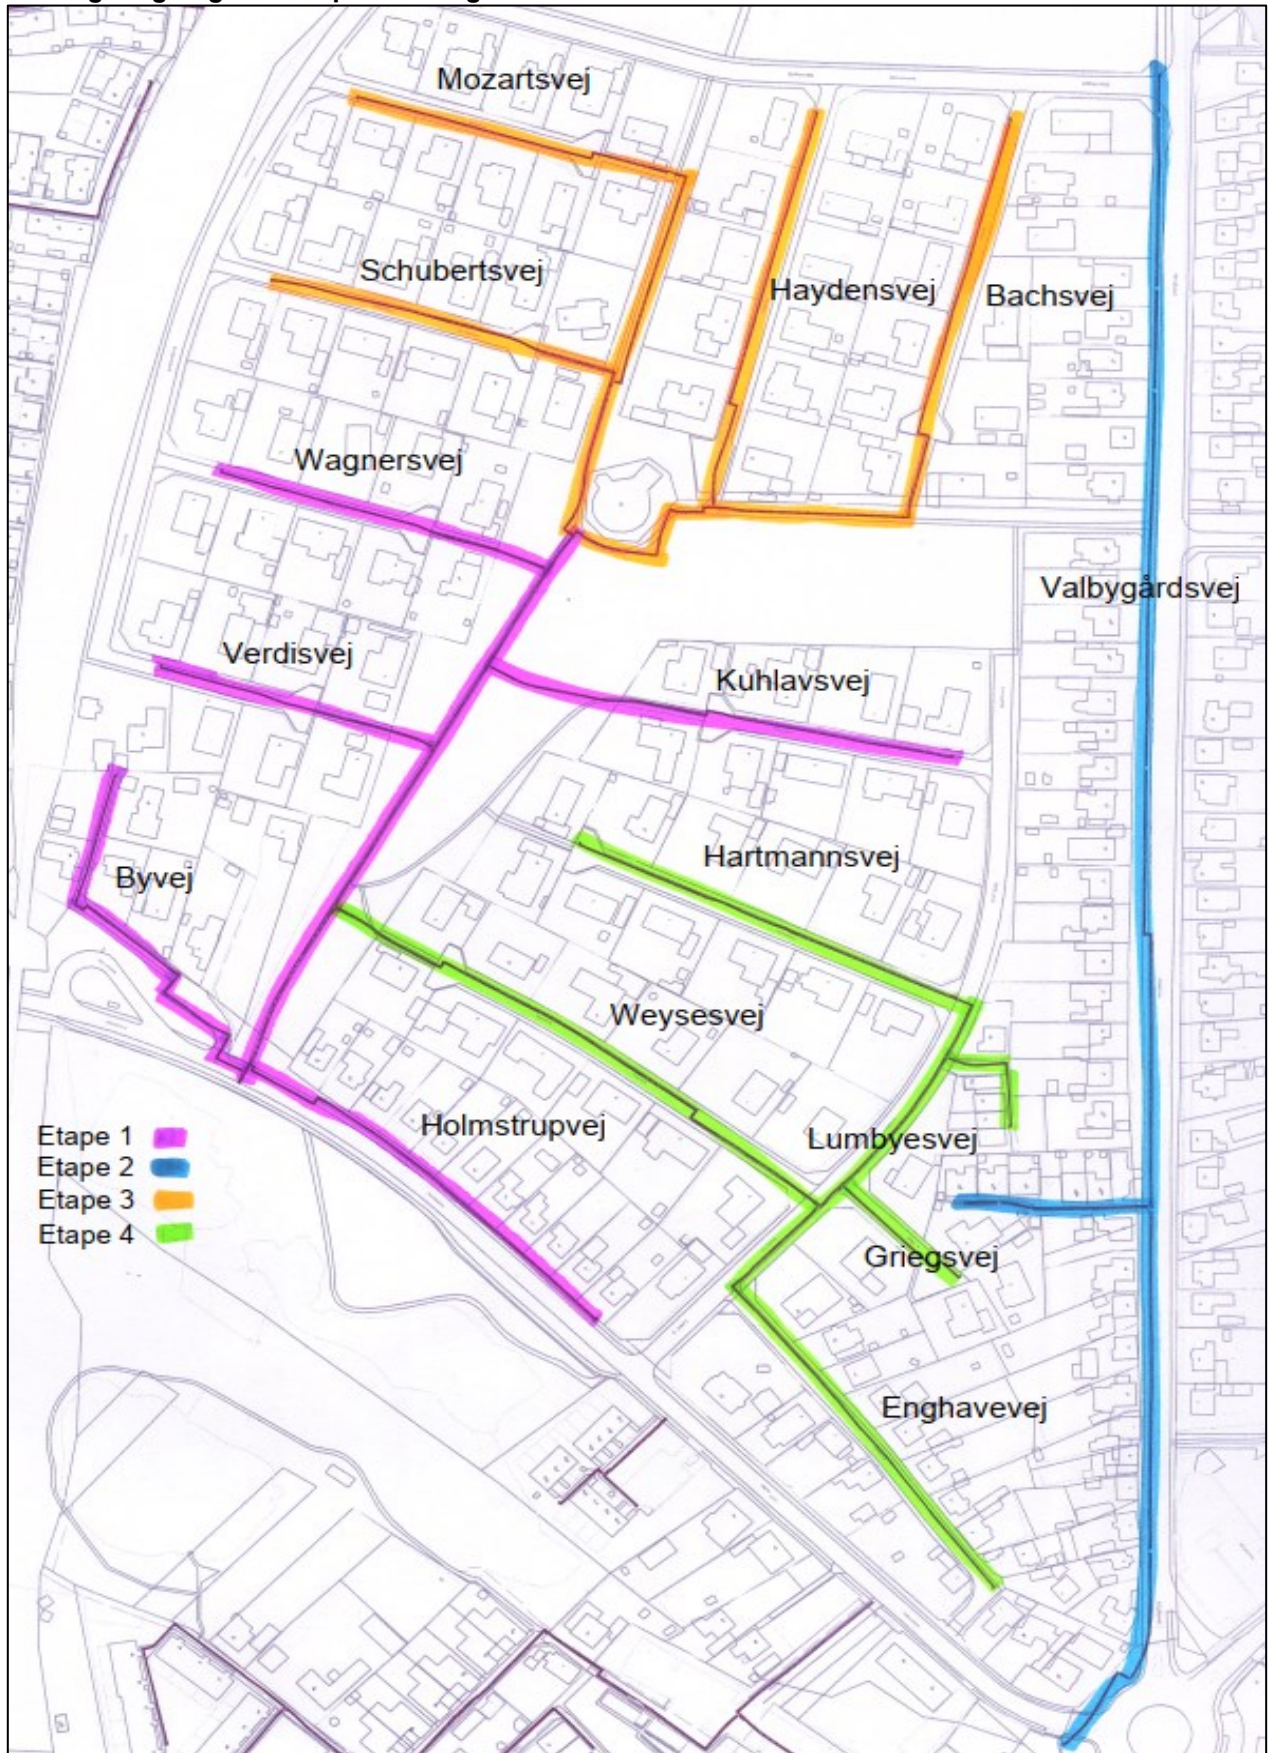

Slagelse Vest - Område 1.
