

Nyhedsbrev 4 – Område 1 i Slagelse Vest

Den 13-06-2024
Kontaktperson: Hans Post
T: 58 36 25 00
E: fjvslagelsevest@envafors.dk

Udbygning af fjernvarmenettet i Slagelse Vest

Entreprenøren har nu fået udlagt ny muldjord langs stierne ved vandtårnet og er i øjeblikket i gang med græssåning.

På Byvej og Bachsvej er vi blevet færdige med reetablering af fjernvarmerenderne, og hvor der snart vil blive udlagt den grove asfalt, som skal ligge i ca. 1 år, hvorefter der bliver udlagt nyt slidlag i fjernvarmetraceet. Udlægning af asfalten på Bachsvej, Byvej, Kuhlausvej og Mozartsvej er sat til udførelse i uge 26.

Vi fortsætter med udførelse af stikledninger til beboer/ejendomme, som har tilmeldt sig fjernvarmen og som før nævnt bliver man kontaktet af entreprenøren for gennemgang af det aftalte stiktrace mv.

Det er planen at få vand på de første nye fjernvarmledninger på etape 1 i uge 26 og for etape 3 i uge 27 og til sidst men ikke mindst etape 4 i uge 28 😊. Der bliver udsendt en mail, når man kan påbegynde konvertering til fjernvarmeforsyning.

Vi forventer at kunne igangsætte fjernvarmearbejdet på Valbygårdsvej i uge 25. Valbygårdsvej vil blive ensrettet i forbindelse med fjernvarmearbejdet, så trafikken kun kan køre udad byen.

Fjernvarmearbejdet på Valbygårdsvej vil blive opdelt i 3-4 deletaper.

I forbindelse med fjernvarmearbejdet på Valbygårdsvej bliver der opsat trafikværn på deletapen, hvor der arbejdes med fjernvarmen, for at sikre folkene som arbejder på stedet. Det betyder desværre også, at berørte beboer ikke kan parkere deres biler ved deres ejendomme på etapen, hvor der arbejdes. Der bliver i stedet for mulighed for at parkere bilerne på en vejstrækning, som bliver indrettet som midlertidige parkeringspladser for berørte beboer/ejendomme.

På strækninger, hvor der arbejdes med fjernvarmen, vil kørebaner som udgang være lukket for trafik i perioden fra ca. kl. 7:00 til og med kl. 15:00, og vi håber på jeres forståelse herfor 😊.

Når entreprenøren er færdig med udførelsen af jeres fjernvarmestik, vil der blive udleveret en tilfredshedserklæring fra entreprenøren, hvor I kan komme med ris eller ros i forbindelse med fjernvarmearbejdet. Det er også på tilfredshedserklæringen I bedes oplyse evt. skader og mangler, så disse kan blive udbedret af entreprenøren. Tilfredshedserklæringen vil enten blive udleveret af entreprenøren selv, eller den vil blive lagt i jeres postkasse.

Tilfredshedserklæringen kan afleveres i en postkasse placeret ved skurbyen på Gadekærvej 2, eller den kan sendes på mail til kfh@mse-as.dk.

Entreprenøren MSE holder sommerferie i ugerne 29, 30 og 31, og derfor vil der være mindre bemanning og aktivitet i jeres område i den nævnte ferieperiode.

Vejledende tidsplan for område 1:

Sti/græsareal mod vandtårnet: Hovedledninger er færdige.

Sti/græsareal efter vandtårnet mod Schubertsvej: Hovedledninger er færdige.

Sti/græsareal fra vandtårnet mod Valbygårdsvej: Hovedledninger er færdige.

Byvej: Hovedledninger og stik er færdige.

Verdisvej: Hovedledninger og stik er færdige.

Wagnersvej: Hovedledninger og stik er færdige.

Kuhlausvej: Hovedledninger og stik er færdige.

Holmstrupvej: Hovedledninger pågår og forventes færdige i uge 26. Udførelse af stik er færdig.

Valbygårdsvej: Hovedledninger forventes udført fra uge 25 til og med uge 28 og fra uge 32 til og med uge 34. Udførelse af stik forventes udført fra uge 25 til og med uge 28 og fra uge 32 til og med uge 34.

Schubertsvej: Hovedledninger og stik er færdige

Mozartsvej: Hovedledninger og stik er færdige

Haydnsvej: Hovedledninger pågår og bliver færdig i uge 25. Udførelse af stik pågår og forventes færdig i uge 25.

Bachsvej: Hovedledninger og stik er færdige.

Weysesvej: Hovedledninger pågår og forventes færdig i uge 25. Stik er færdig.

Lumbyesvej: Hovedledninger pågår og forventes færdig i uge 26. Udførelse af stik pågår og forventes færdig i uge 24/25.

Hartmannsvej: Hovedledninger pågår og forventes færdig i uge 25. Stik er færdig.

Enghavevej og Griegsvej: Hovedledninger pågår og forventes færdig i uge 26. Udførelse af stik pågår og forventes færdig i uge 25.


Med venlig hilsen

Hans Post

Nyttige mail-adresser

Envafors:	E-mail
Hans Post – Projektleder og tilsyn	fjvslagelsevest@envafors.dk
Hovedentreprenør MSE A/S:	
Brian Pyndt – Formand	bp@mse-as.dk
Kaj Hansen – Formand f. stik	kfh@mse-as.dk
Louise Jørgensen – Projektassistent v. spørgsmål til før-fotoregistrering mv.	lkj@mse-as.dk

Øversigtstegning med etapeinddeling for område 1:

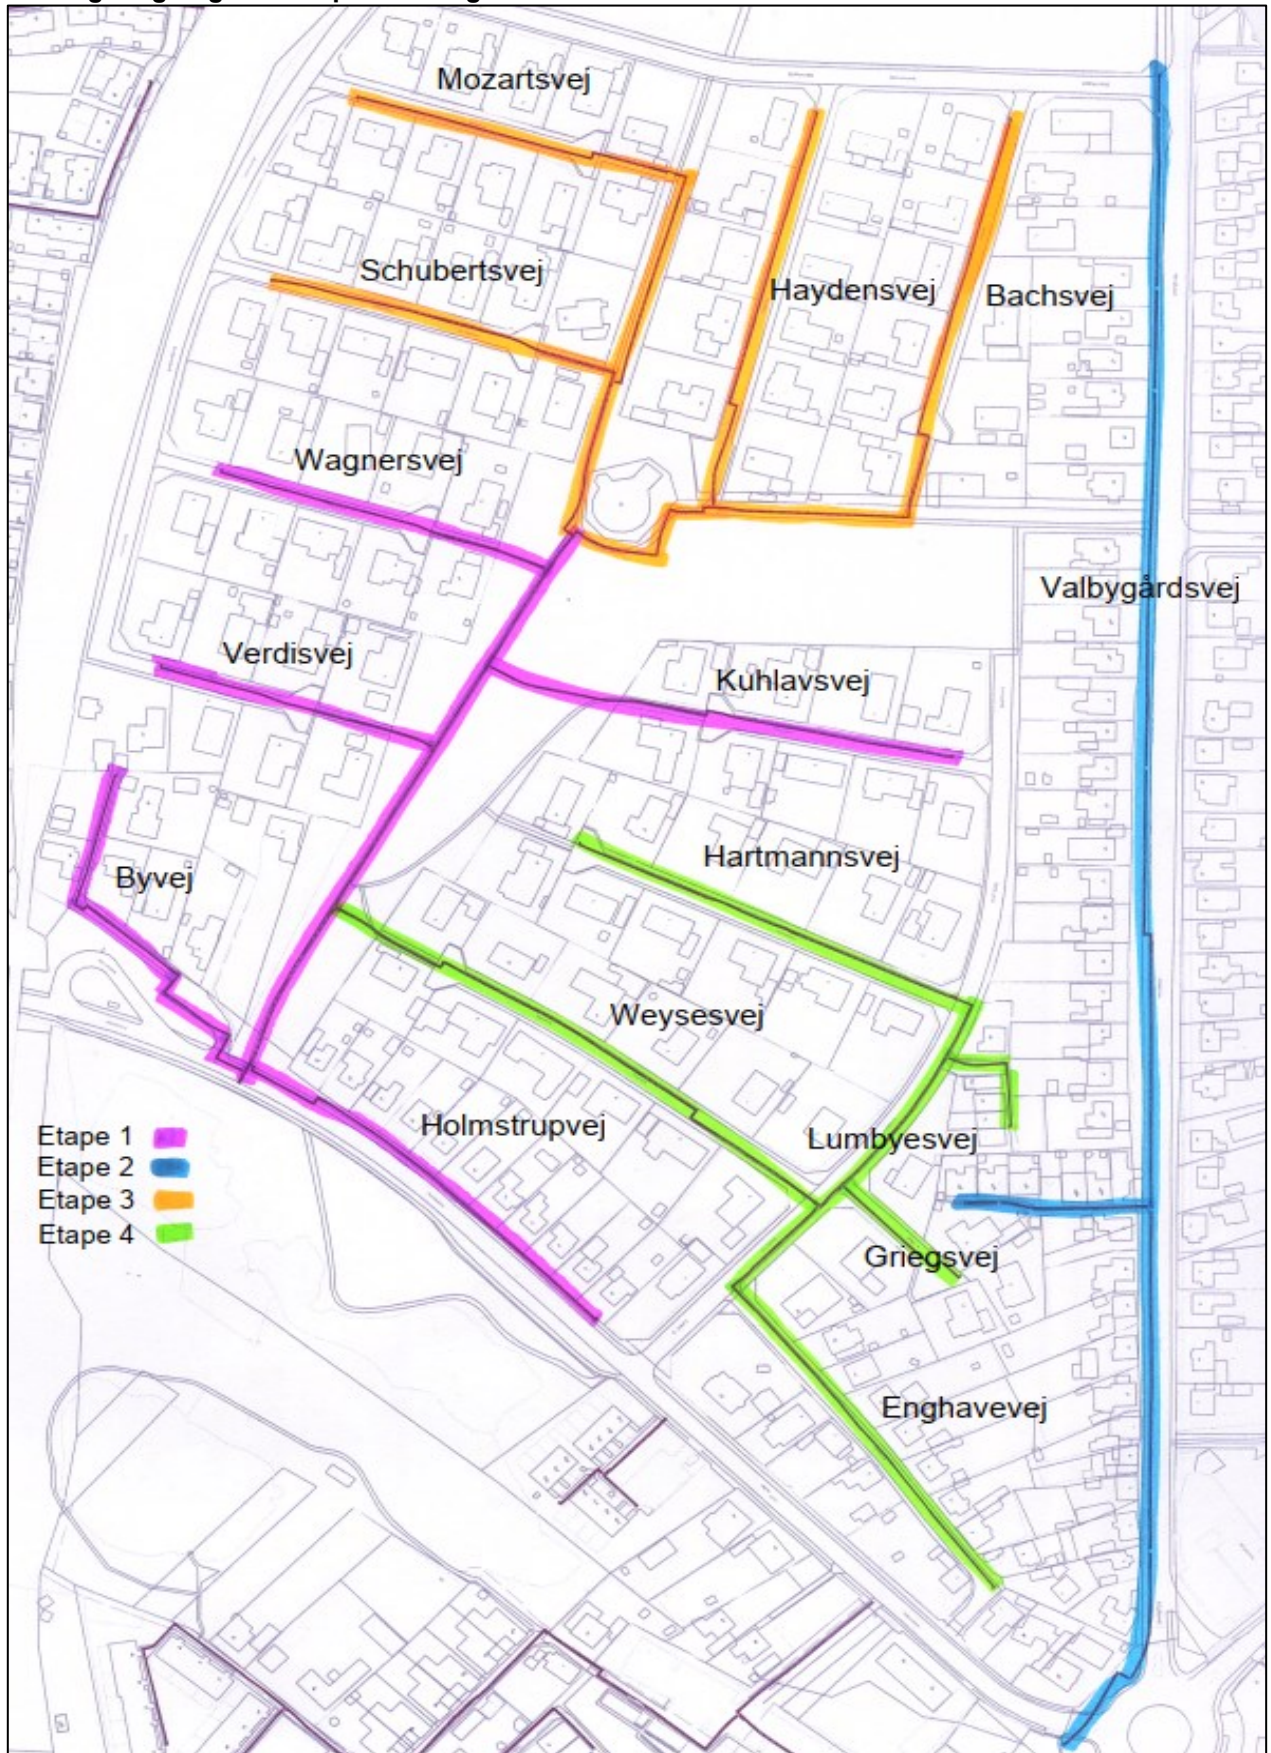

Slagelse Vest - Område 1.
